利民集团ERP一阶段项目
实施工作说明书（SOW）

合同编号:CON202601210754

甲　方：利民（番禺南沙）电器发展有限公司
乙　方：金蝶软件（中国）有限公司

签约日期：　2026 年　月　日

撰写记录

日期	作者	审核人	版本	修改说明
2026.1.21	郭俊贤			

目录

1 前言 4
1.1 文档目的 4
1.2 相关文档 4
2 项目综述 5
2.1 项目背景 5
2.2 项目目标 5
3 项目范围 6
3.1 产品范围 6
3.2 项目组织范围 6
3.3 实施业务范围 6
3.4 定制化开发范围 8
3.5 系统集成范围 8
3.6 初始数据转换范围 8
3.7 系统环境要求 10
3.8 培训服务 10
3.9 上线支持 11
4 项目计划 12
4.1 实施策略 12
4.2 总体计划 12
4.3 项目资源计划 13
4.4 项目里程碑 13
4.5 工作分解结构（WBS） 14
5 项目组织及职责 15
5.1 项目组织架构 15
5.2 责任与义务 15
5.3 角色与职责 17
6 关键假设及约定 21
6.1 关键假设条件 21
6.2 项目约定 24
7 项目验收 28
7.1 项目实施完成确认 28
7.2 验收标准 28
7.3 验收方法 28
7.4 验收内容 29
8 项目控制程序 30
8.1 项目变更控制程序 30
8.2 交付物接受程序 32
8.3 争议解决程序 32
9 附件一：《利民集团ERP项目WBS》 34
10 附件二：《需求变更申请单》 38
11 附件三：《项目经理任命书》 40

1 前言

1.1 文档目的

“工作说明书（SOW）”描述了金蝶软件（中国）有限公司（以下简称为“金蝶”或乙方）为利民（番禺南沙）电器发展有限公司(以下简称为“利民集团”或甲方)实施利民集团项目的工作内容，旨在界定实施服务明细条款。本SOW定义了甲方和乙方在本项目中约定的具体项目范围、任务、实施计划、资源计划、基本假定、交付物和工作职责等内容。

任何对本工作说明书的修改都应遵循项目变更控制程序。对变更的评估和实施可能会对预估的时间进度、费用以及本工作说明书的其他条款作相应的调整。

本工作说明书、其附录和协议形成双方之间关于所述主题的完整协议，并取代先前的任何口头和书面沟通，先前其他任何协议、约定与本SOW存在差异或者冲突时，以本SOW为准。本SOW将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。本工作说明书随主合同签署同时生效。

1.2 相关文档

SOW撰写相关参考文档有：

- 《利民集团ERP项目一阶段销售合同》（主相关）

若在项目实施过程中发生项目变更，则以双方确定的项目变更文档规定内容为准。

2 项目综述

2.1 项目背景

利民公司为适配业务发展引入多套业务系统，但系统间形成数据孤岛，业务流程割裂，跨环节联动不足，需依赖大量人工管控维持运转，效率低下且成本偏高。同时，零散的平台架构导致内控支撑薄弱，运维管理复杂度高，制约企业数字化转型。

2.2 项目目标

本 ERP 项目旨在解决当前集团化运营能力缺失、成本管理精细化不够及经营数据价值挖掘薄弱等核心痛点，通过系统升级与功能优化，实现集团内往来业务的自动化处理，打通公司级业财流程，提升业务流转效率；减少手工操作与人员依赖，降低数据追溯难度；构建可追溯的精细化成本管理体系，替代手工成本核算模式，突破品类法局限，提升成本核算精度与分析能力；搭建智能化预警机制，解决数据滞后问题，充分释放数据价值，为企业经营决策提供实时、精准的数据支撑，最终助力企业实现更高效的集团化管控、更精细的成本管控与更敏捷的经营决策。

3 项目范围

3.1 产品范围

软件实施是乙方有偿向甲方提供的交付服务，乙方为甲方实施利民集团ERP系统，采用以下产品及版本：

产品类别	产品名称	产品版本	是否本SOW范围
主产品	**金蝶AI星空套件公有云**	/	是

3.2 项目组织范围

本次利民集团项目在一个数据中心范围内实施服务的主体为：

序号	公司名称	公司性质
1	RIMIN ELITE COMPANY LIMITED	*单体公司*
2	利民实业有限公司	*单体公司*
3	利民（番禺南沙）电器发展有限公司	*单体公司*

备注：本次不涉及海外交付。

3.3 实施业务范围

本节所述实施范围为最大实施范围框架。根据项目执行中的具体情况，乙方与甲方协商后可以在此框架内对实施范围进行进一步明确，最终范围将以双方在项目执行过程中确定的范围基准为准，但不会超出本节描述的实施范围框架。

3.3.1 实施业务模块范围

本次实施工作涉及业务模块及实施主体相关下属组织列示如下：

模块	子模块	RIMIN ELITE COMPANY LIMITED	利民实业有限公司	利民（番禺南沙）电器发展有限公司
财务云	总账	√	√	√
财务云	智能会计平台	√	√	√
财务云	报表	√	√	√
财务云	固定资产	√	√	√
财务云	出纳管理	√	√	√
财务云	应收款管理	√	√	√
财务云	应付款管理	√	√	√
财务云	发票管理	√	√	√
财务云	存货核算	√	√	√
财务云	实际成本核算	/	/	√
供应链云	采购管理	√	√	√
供应链云	销售管理	√	√	√
供应链云	库存管理	√	√	√
供应链云	组织间结算	√	√	√
制造云	工程数据管理	/	/	√

制造云	生产管理	/	/	√
制造云	委外管理	/	/	√
人人业务云	业务审批	√	√	√
开发服务云	开发服务云-融合版	√	√	√
多语言	多语言	√	√	√

说明：

“√” 表示在项目一期实施范围中实施；“／”表示本项目实施范围中不存在。各阶段、各公司如存在超过以上模块范围实施需求时，需要重新评估并签署实施交付合同。

3.3.2 实施业务功能范围

本项目中实施模块功能以金蝶AI星空套件公有云产品操作说明书和标准功能为准，详细功能及说明如下：

模块	模块编号	子模块	实施要点	实施要点内容说明
财务云	1	总账	基本流程	基于标准产品功能，基于统一财务核算体系下核算主体的会计科目、初始化、月末结账、结转损益、期末调汇、账表查询。
财务云	2	智能会计平台	基本流程	基于标准产品功能，主要提供设置凭证模板用于生成总账凭证。
财务云	3	报表	基本流程	基于标准产品功能，主要通过财务报表可实现单体组织的报表出具，同时完成合并报表应用所需报表的编制、审批以及上报处理。
财务云	4	固定资产	基本流程	基于标准产品功能，基于统一财务核算体系下核算主体的资产基础资料、初始化、日常资产账务业务处理（新增、清理、调拨、变更）、月末折旧、关账、账表查询。
财务云	5	出纳管理	基本流程	实现日常出纳收付款业务处理
财务云	6	应收款管理	基本流程	基于标准产品功能，主要将供应链销售以及出纳收款紧密结合，完成客户往来数据转换为应收数据，并完成往来资金的结算。
财务云	7	应付款管理	基本流程	基于标准产品功能，主要将供应链采购以及出纳付款紧密结合，完成供应商往来数据转换为应付数据，并完成往来资金的结算。
财务云	8	发票管理	基本流程	基于标准产品功能，主要将供应链采购应付与销售应收紧密结合,完成往来数据转换为发票数据,并完成发票台账记录。
财务云	9	存货核算	基本流程	基于标准产品功能，主要通过与供应链、生产制造、应收应付、资产管理、总账等系统的无缝集成，完成成本管理、为成本分析提供财务数据。
财务云	10	实际成本核算	基本流程	基于标准产品功能，通过完成投入、产品、费用归集，完成细化成本的核算。
供应链云	11	采购管理	基本流程	基于标准产品功能。从采购订单、收货、入库、采购退货申请、采购退料、暂估、应付、采购发票、付款申请、付款处理等功能。

供应链云	12	销售管理	基本流程	基于基于标准产品功能。销售全流程：提供从报价、合同、订单、发货、出库、退货到应收的完整闭环。
供应链云	13	库存管理	基本流程	基于标准产品功能。实现库存盘点、库存调拨、其他出入库等库存相关业务操作。
供应链云	14	组织间结算	基本流程	基于标准产品功能，通过组织间结算平台，配置多种结算模式，选择不同的业务配置模型，定义参与结算的业务单据、取价规则、结算路径等完成组织间结算。
制造云	15	工程数据管理	基本流程	对生产制造领域的BOM、工艺、工程变更等进行集中管理。 乙方在项目实施过程中提供行业最佳实践建议，主导编写《物料编码规范文档》《物料清单（BOM）设计规范文档》规范文档，根据确认的规范，完成系统中物料主数据与BOM模块的相关配置，指导并协助甲方进行物料及BOM数据的清洗、转换与映射。 甲方提供在现有的物料编码规则、BOM结构、分类标准等原始资料，组织研发、工程、生产、计划、采购、财务等相关部门参与规范评审，并拥有最终确认权，负责提供完整、准确的原始数据，并指派专人负责数据的清洗、整理与导入准备，负责组建主数据管理团队，并确保其全程参与。
制造云	16	生产管理	基本流程	基于标准产品功能，以生产工单为主线，从领料、退料、补料，到产品完工入库，实现了生产管理的全过程监督与控制
制造云	17	委外管理	基本流程	基于标准产品功能，以委外工单为主线，从委外采购、委外领料、委外退料、委外补料、到委外入库，实现了委外管理的全过程监督与控制
人人业务云	18	业务审批	基本流程	实现在企业微信上实现金蝶AI星空套件的移动业务审批
开发服务云	19	开发服务云-融合版	基本功能	提供开发服务云-融合版基本操作培训，
多语言	20	多语言	基本功能	系统语言支持中英文切换

3.4 定制化开发范围

无。

如项目中存在上述范围之外的定制化开发内容，乙方将出具功能清单，由双方项目组共同确认，并签署需求变更申请单（PCR）。如甲方不予及时确认并签署PCR，乙方将不提供该项定制化开发服务。

3.5 系统集成范围

本项目无系统集成范围。但乙方提供金蝶AI星空套件公有云产品开放API接口。

3.6 初始数据转换范围

乙方在项目实施过程中将指导和协助甲方将主数据和期初数据引入系统中，本项目包含以下初始数据转换范围：

序号	初始数据名称	数据范围描述
1	物料	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
2	供应商	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
3	客户	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
4	部门	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
5	员工	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
6	科目	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
7	总账科目初始余额	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
8	银行存款/现金初始余额	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
9	期初销售出库单	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
10	期初销售采购单	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
11	期初库存	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
12	期初存货核算余额	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
13	BOM表	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
14	期初生产工单及对应耗用	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
15	期初委外工单及对应耗用	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入
16	期初费用报销单、差旅报销单、借支单	乙方提供数据模板，甲方负责初始化数据整理，由乙方导入

数据转换工作说明：

(1) 充分考虑甲方目前所使用的计算机系统及数据量的大小，以此确定初始数据的转换策略，数据量较大的主数据转入的工作将通过数据导入的方式进行；具体的数据转换工作的原则是集中数据收集，统一执行切换；

(2) 乙方提供数据收集模板；甲方根据模板准备数据，并且在计划要求的时间范围内完成，并确保数据的完整性、准确性；如果由于甲方数据问题所产生的额外工作人天，应由甲方承担相应的费用；

(3) 甲方用户在乙方顾问的指导和培训后，把静态数据和初始化数据导入系统；

(4) 对于数据量少的数据，可以采用手工录入的方式；对于此部分数据录入的人员安排，由甲方负责手工录入系统；

(5) 乙方提供数据收集的培训，并指导甲方对数据做必要的检查，但不对非乙方原因造成的数据错误负责；

(6) 乙方将会按照双方确认的截止日期，协助甲方对主数据和期初数据余额进行数据转换，但不负责甲方历史业务数据迁移和初始化之后发生的业务数据的导入。

3.7 系统环境要求

(1) 甲方负责此信息化系统建设所需的软硬件环境（包括但不限于测试环境、开发环境、生产环境等）以及项目所需的软硬件配套设备的购置、准备、安装、调试、维护，负责各类数据库管理、访问控制、备份与故障恢复，以及存储数据安全管理；乙方可以根据项目的业务范围给予对应的系统配置建议；

(2) 甲方负责最终用户端全部个人计算机的购置及准备工作，按总体实施计划中的日期要求准备好；

(3) 除本项目合同约定由乙方提供的软件系统外，其他软件由甲方提供，并按要求日期准备好；

(4) 乙方按本项目合同约定提供软件系统的测试环境、开发环境、正式环境的设置；并提供准确的正式环境设置文档；

(5) 除本项目合同约定私有化部署服务端由乙方完成部署工作外，服务端所涉及的系统部署安装、调试（含乙方软件部署）、运维工作由甲方自行完成。如项目中需要乙方进行私有化部署安装和服务端日常运维支持工作，双方应签署《系统集成服务合同》，由乙方提供系统维护工作。

(6) 乙方负责对甲方人员进行乙方软件客户端（如有）的安装部署方法的培训。所有客户端的安装部署由甲方负责完成。

(7) 乙方负责出具定制化开发标准、定制化代码管理标准以及定制化功能的性能优化；

3.8 培训服务

培训的目标是帮助甲方掌握在使用、维护系统过程中所需的基本技能，培养自己的技术团队，以应对将来可能发生的需求变化或者系统升级，同时能够对大量的系统用户进行基础培训。

项目过程中的培训包括以下内容：

培训内容	培训讲师	培训对象	培训方式	培训地点
标准功能培训	乙方顾问	关键用户、IT维护人员	课堂培训	客户现场（南沙及香港）
数据收集方法培训	乙方顾问	关键用户、IT维护人员	实施过程+课堂培训	客户现场（南沙及香港公司现场）

系统设置培训	乙方顾问	关键用户、IT维护人员	课堂培训	客户现场（南沙及香港公司现场）
关键用户培训	乙方顾问	关键用户、IT维护人员	课堂培训+现场辅导	客户现场（南沙及香港公司现场）
最终用户系统操作培训	甲方关键用户	终端用户	课堂培训+现场辅导	客户现场

3.9 上线支持

乙方在系统上线后将提供三个月的上线支持服务，帮助甲方解决上线后可能出现的流程和系统问题，并对上线后发现的不合理流程提出优化建议，上线支持服务以上线后第三个月的RIMIN ELITE COMPANY LIMITED公司月末结账为结束点。

序号	上线支持内容	上线支持完成标准
1	总账	完成三个月的月末结账
2	报表	出具三个月的财务报表
3	出纳管理	出具三个月的余额调节表
4	固定资产	计提完成三个月的折旧
5	应收款管理	往来业务数据的核销，应付账龄的查询
6	应付款管理	往来业务数据的核销，应收账龄的查询
7	发票管理	完成三个月发票台账登记以及对应报表查询
8	存货核算	完成三个月存货核算以及对应报表查询
9	实际成本核算	完成三个月工单成本核算以及对应报表查询
10	采购管理	进行三个月销售合同/订单的附件审批。
11	销售管理	完成三个月的采购申请、订单以及对应的采购报表
12	库存管理	完成三个月的正常出入库运行
13	组织间结算	完成三个月组织内部往来结算以及对应报表查询
14	工程数据管理	完成三个月物料清单数据录入
15	生产管理	完成三个月生产工单录入以及对应报表查询
16	委外管理	完成三个月委外工单录入以及对应报表查询

4 项目计划

4.1 实施策略

本项目整体实施策略如下：

序号	业务板块	组织范围	业务数据范围	分期策略	推广策略			实施地点			
					试点	推广	推广责任方	总部集中	总部分散	异地集中	异地分散
1	财务、供应链	RIMIN ELITE COMPANY LIMITED	REC所有客户	一期		√	乙方	√			
2	财务、供应链	利民实业有限公司	REC业务	无		√	乙方	√			
3	财务、供应链、生产管理、工程数据、委外	利民（番禺南沙）电器发展有限公司	RILHK业务	无		√	乙方	√			

1. 本次利民集团项目采用现场、非现场两种方式进行实施，“培训指导”工作采取集中在利民集团总部统一开展，部分实施、测试、电话支持、远程支持等工作采取非现场的方式来实施。

2. 本次项目严格执行“上一阶段成果确认，才能继续开展下一阶段工作”的项目管理要求。

说明：

• 乙方主导推广：乙方负责推广计划、系统上线方案、上线支持，甲方给予人员、设备、场地等资源积极配合。

• 甲方主导推广：甲方负责推广计划、系统上线方案、成立支持小组负责系统上线后支持，乙方顾问负责上线产品质量问题处理。

4.2 总体计划

本章节的总体进度和里程碑，基于甲方积极有效配合的前提作出。

本 SOW（含附件）的项目计划日期均为预计日期。项目的开始日期以实际签署合同的日期为基础，以双方协商确定的日期为准。在项目实施开始及过程中，双方项目组可依据项目的客观条件和实际情况进行协商，对项目计划作出调整。

项目总体计划如下：

阶段	开启日期	结束日期

启动	2026/3/9	2026/3/11
需求	2026/3/12	2026/4/2
方案	2026/4/3	2026/5/7
构建	2026/5/8	2026/6/3
测试	2026/6/4	2026/7/25
上线	2026/7/27	2026/10/23
验收	2026/10/24	2026/10/30

4.3 项目资源计划

模块	资源名称	启动	需求	方案	构建	测试	上线	验收	总计
财务供应链制造	项目经理	3	30	30	20	20	5	1	109
财务核算	财务顾问	2	19	19	30	25	21	1	117
供应链	供应链顾问	2	19	19	30	25	21	1	117
制造	制造顾问	2	19	19	30	25	21	1	117
汇总		9	87	87	110	95	68	4	460

4.4 项目里程碑

里程碑	任务名称	关键交付物
★	业务蓝图确认	《业务蓝图确认单》 (双方项目经理签字或盖章)
★	用户测试确认	《UAT测试确认单》 (双方项目经理签字或盖章)
★	系统上线确认	《系统上线完成确认单》 (双方项目经理签字或盖章)
★	项目验收确认	《实施完成确认单》 (双方项目经理签字或盖章)

说明：☆为项目关键进度里程碑。★为合同付款里程碑

4.5 工作分解结构（WBS）

工作分解结构（WBS）是根据售前阶段对本次项目的了解给出的初步工作计划建议，详见附件一《利民集团ERP项目WBS》，最终执行的WBS以项目启动阶段双方项目团队协商并经签字或盖章确定的项目总体计划为准。

5 项目组织及职责

5.1 项目组织架构

为保证本项目成功实施，双方需要成立专门项目组织，组织架构如下：

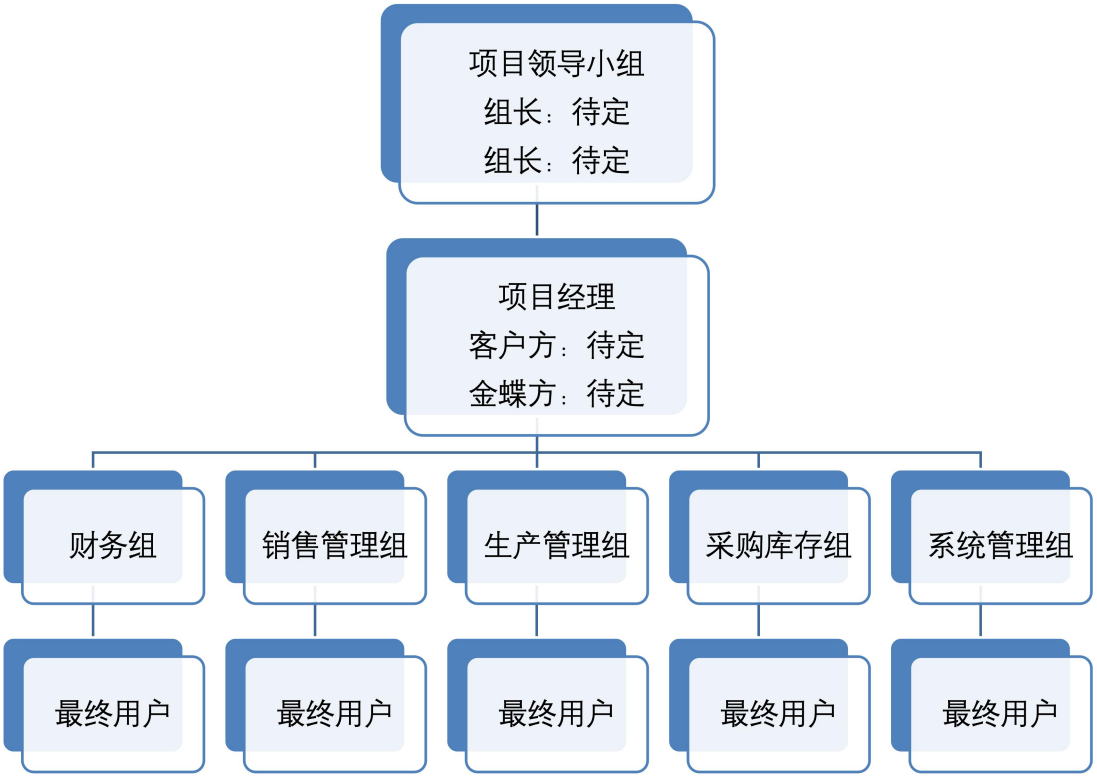

5.2 责任与义务

5.2.1 甲方责任

组织与资源

1) 建立完备的项目组织，执行客户方项目管理；

2) 提供足够的资源全职参与项目的实施，确保每个业务板块至少选派一名熟悉业务管理并且能够提出建设性意见的业务骨干作为甲方项目组关键用户，参与系统学习和项目实施推进，未来作为甲方内部推广应用的骨干力量。如果乙方确认甲方选派的项目成员不能满足项目实施和推进的要求，甲方应提供其他备选人员；

3) 如果因甲方人员变动导致本项目实施延误或增加乙方的工作量(包括但不限于增加培训服务），乙方对此延误不承担责任，并有权要求甲方支付乙方增加工作量的服务费；

4) 确保在乙方合理要求时，其员工可以提供有关的协助，并且可以合理地访问甲方的高级管理人员以及其任何员工，使乙方可以提供服务；

5) 甲方负有协助乙方团队成员稳定的义务。自本项目合同签定之日起至项目完成后12个月内为禁止期。在禁止期内，甲方不得录用参与本项目的乙方顾问，包括：乙方顾问离职后加入甲方，或在甲方兼职。

项目协作

1) 在乙方顾问的指导下，甲方配合编写会议纪要、收集与整理数据、编制蓝图流程图、编写测试案例、进行UAT测试和执行数据转换等项目工作；

2) 甲方提供所有需要的合理的信息和资料以使乙方可以提供服务。甲方同意向乙方已透露的或将要透露的所有信息是真实、准确并且不会产生误导。乙方对于由甲方提供的不准确、不完整或有其它缺陷的信息和资料所造成服务中的任何损失、损坏或不足，不承担法律责任；

3) 提供各类与项目需求相关的技术文档：如连线设备的技术文档，内部系统的接口文档等；

4) 做出对解决方案和技术体系结构的最终选择；

5) 有责任告知乙方公司其他正在开展的新业务和新项目，如果它们对本项目有一定影响；

6) 配合协调项目中的沟通，及对各项目阶段交付成果的确认及签署；

办公设施

1) 甲方向乙方及其工作人员提供适当的项目办公室空间，和乙方实施服务时所合理需要的其它办公场所和设施，为乙方工作人员提供计算机网络接入设施、电话 / 传真通信、模拟线路和远程拨号访问能力、和其它设施。乙方项目团队的工作位置应接近甲方业务部门和技术人员的工作区域，并且应提供访问此区域所需的所有安全证件和手续；

相关设备列表：

工作场所安排	工作场所安排	需要安排独立的办公空间，并建议甲方项目成员同项目组一同办公
相关设备安排	电话	应至少有一个电话，如房间较大，应适当增加电话台数
	网线	应确保每个座位能分配一根网线或采用无线网络，并应确保能登陆互联网及使用邮箱、微信等沟通工具
	打印机及打印纸	应提供一台打印机供项目组长期使用，可与其他部门共用
	白板及水笔	应至少提供一块白板供项目组长期使用
	投影仪	应提供一台投影仪供项目组长期使用
	会议室	应有相匹配的会议室，供项目组召开相应的会议
	电源插座	若干
	废弃文档处理方法及相关的设备	此项是为信息安全考虑，非必需
办公用品	办公用品	文件夹、回形针、胶水、剪刀、订书机、计算器、废纸篓、垃圾袋等日常用品

2) 提供具备正版操作系统、病毒防护系统的客户端硬件；

3) 按照项目进展的要求购置项目实施所需硬件(各系统服务器、交换机、扫描枪、基站、客户端PC、打印机等)以及所有硬件需安装的软件：操作系统、驱动程序、数据库、杀毒软件、开发所需的开发工具及远程登录服务器许可证等。并且负责上线系统所需的微软office软件；

4) 负责各类数据库管理、访问控制、备份与故障恢复,以及存储数据安全管理。

法律、法规和法令

甲方负责确定、解释影响甲方的应用程序或业务的任何适用法律、法规和法令。

甲方内部管理制度告知责任

若甲方内部任何管理制度、规定、规范、要求在项目实施过程中要求适用于乙方项目组及成员，甲方需事先对乙方项目组及成员进行正式书面通知并进行必要培训。

5.2.2 乙方责任

组织与资源

1) 乙方应保证其项目组成员的相对稳定，不得任意更换顾问，但在特别情况下经双方协商，一致同意后，可委派同资历的顾问来更换现有顾问进行实施。乙方也有权委派金蝶体系内其他公司顾问来实施服务。任何更换应征得甲方同意并保证不影响服务的质量及实施的进程。

项目目标及计划

1) 检视双方在工作说明书及合同上的责任，统筹协调资源以确保达成项目目标；

2) 从总体上控制项目实施时间进度，保证服务质量；

3) 建立交付物的文档和程序标准；

4) 复核项目任务、时间表和资源，并相应进行更改或添加。与甲方项目经理评测和评估该项目计划；

5) 与甲方项目经理一起找出和解决项目计划的偏差；

6) 与甲方项目经理一起管理项目变更控制程序；

5.3 角色与职责

5.3.1 甲方角色与职责

甲方应指派相应的工作人员组成项目组，并保证指派专门的人员负责执行本合同及其附件项下甲方的工作。甲方的主要角色及职责如下：

项目角色	项目职责
项目领导小组	✧总体项目管理、监督项目进程

	✧管理项目范围变更 ✧商议并解决由项目经理提出的项目重大问题负责指派高层管理人员参与项目领导工作，使项目的执行得到甲方和乙方领导层的充分重视和支持 ✧总体把握项目的方向、进展和结果
项目经理 (全职参与)	✧对本项目实施承担直接负责，能协调项目所需的各级资源，参与项目周例会，月例会及阶段工作汇报会议，签署蓝图方案及验收报告 ✧总体项目管理、监督项目整个进程，推动项目按时、高质完成 ✧负责项目的整体资源安排 ✧配合和协助乙方项目经理对项目进行计划和管理 ✧与乙方项目经理共同主持项目的日常工作，负责进度与调配资源 ✧定期参加项目指导委员会工作会议，确保项目总体进度按计划进行 ✧协调项目组内外部各级管理层的关系，和甲方管理层沟通以确保管理层足够理解项目状况 ✧监督各项工作的完成和质量保证 ✧支持乙方项目经理管理和协调项目 ✧支持乙方项目经理管控项目方向，进展和结果 ✧参与处理项目中的各种问题 ✧负责关键交付文档的签署 ✧负责每周对乙方提交的《服务明细确认单》进行确认
关键用户 (全职参与)	由甲方业务部门骨干组成，需了解现有业务情况与对系统的需求，具备较强的学习能力，具备较强的沟通能力 主要工作内容： ✧负责提供现行业务情况的资料，收集和分析业务需求，数据准备，帮助规划和确认实施项目的实施方案、业务流程等，确认业务方案的合理性 ✧完成项目经理交给的各项任务 ✧建立验收测试的场景并进行验收测试 ✧期初数据与基础数据的整理、校验、确认 ✧提前参与培训、测试及上线准备工作 ✧负责对本业务单位的最终用户进行培训 ✧负责系统上线后的日常运行支持 ✧配合项目成果验收
IT 组 (全职参与)	由甲方技术人员组成，负责提供现行系统技术资料，解决项目实施过程中软硬件和网络方面的问题，负责系统的安装、备份和整理 ✧参与/主导有关业务流程和客户化方案讨论 ✧参与/编写方案设计文档 ✧负责完成测试用例的编写 ✧参与和指导用户系统测试及数据转换工作 ✧期初数据整理与迁移

	✧负责上线后的技术支持

5.3.2 乙方角色与职责

在实施服务过程中，乙方的主要角色及职责如下：

项目角色	项目职责
项目总监	✧总体项目管理、监督项目整个进程，推动项目按时、高质完成 ✧项目团队管理安排 ✧重要里程碑项目节点管控 ✧重大事项协商讨论 ✧内外部资源协调处理
项目经理	✧检视双方在工作说明书及合同上的责任，统筹协调资源以确保达成项目目标 ✧把握项目的方向、进展和结果 ✧与甲方项目经理共同制定和确认项目计划，并按照项目计划指派工作 ✧根据项目的时间表，监督整个项目进程和工作安排，协调各项目小组的工作，确保各项工作按时完成 ✧定期组织项目周例会，向项目组汇报周工作报告 ✧与甲方和乙方管理层作定期的沟通，使管理层对项目的发展有足够的了解 ✧参与项目检讨与相关会议 ✧管理项目进度, 风险, 变更 ✧负责项目过程文档、关键交付物客户签署及归档 ✧评估及跟踪项目待处理问题
实施组长 实施顾问	✧负责依据项目计划及工作说明书编写解决方案 ✧负责蓝图设计、方案编制和需求功能说明书的编写等 ✧跟进项目实施的待处理问题 ✧负责对关键用户的系统培训

5.3.3 职责分配

甲乙双方在项目执行过程中的主要任务活动职责分配如下：

P: 主要负责　S: 协助

任务类型	活动	职责分配	
		甲方	乙方
项目管理	项目管理	S	P
项目实施	产品标准功能培训	S	P
	业务需求调研	S	P
	业务蓝图设计	S	P
	基础数据收集	P	S
	数据清理与校验	P	S
	数据批量导入	P	S
	数据手工录入	P	S
	系统环境部署	S	P
	关键用户培训	S	P
	系统集成测试	S	P
	最终用户培训	P	S
	UAT测试	P	S
	系统上线	S	P
交付物文档	项目总体计划	S	P

	调研纪要	S	P
	业务蓝图	S	P
	数据收集模板	S	P
	用户操作手册	P	S
	UAT测试报告	P	S
	上线切换方案	S	P

6 关键假设及约定

本工作说明书基于下列假定及约定。

项目仅针对SOW中规定的范围，不包括在合同价格商务洽谈以后由于组织机构变动和业务流程重组等各种原因造成的范围变更，在项目建议期间所出现的偏差将通过项目变更控制程序进行管理，并可能导致对项目范围、估计时间表、收费及其它条款进行相应的调整。这些调整包括任何因此导致的额外工作或等候时间所应收取的额外费用。

6.1 关键假设条件

6.1.1一般关键假设

项目管理

1)本项目将采用金蝶项目实施方法论，并使用其工具、流程以及交付件来完成本项目，甲方需认可该方法并且能够按照该实施策略执行；

2)双方项目小组成员能够在整个项目实施期间按甲方正常作息时间从事所承担的项目工作。根据项目工作计划，双方能提供满足需要的各类合格的人员配合项目各阶段性工作；

3)项目实施的成功在很大程度上取决于用户的配合，能够及时的解决企业在实施项目中出现的问题，原则上，对于这些问题，乙方顾问提出建议性方案，甲方应该在5个工作日内作出最终确认，对于一些较难解决的问题，则由双方共同商定解决的时间安排；

4)任何可能影响项目计划的第三方因素(非乙方)应由甲方控制和管理，由乙方提供的第三方服务和产品除外；

5)为满足项目进度，甲方应提供足够的内部资源，以配合乙方顾问完成系统实施的相关工作，如业务调研、接受培训、编制流程图、进行系统测试、编写用户操作手册等；

6)在项目进行期间，甲方组织结构（如：新的组织实体、收购、重组）不会发生变化；如果在超出本SOW范围情况下需要新增加法人实体，需要遵从项目变更流程；

7)乙方能够按时提交有关文档，如无质量问题，甲方在规定的5个工作日内给予明确答复，如逾期未答复，视同确认；如果是否定的答复应有对原因做正式明确的书面或邮件说明；

8)甲方应明确项目交付文档签字代表，以保证项目能够按照工作计划顺利进行；对因甲方签字代表不明确，造成项目成果确认或者项目决策延误，从而使项目延期的，乙方不承担延期责任并有权在项目延误期间不保证顾问资源；

进度计划管理

对非乙方的因素所造成的项目延误，乙方不承担责任，包括但不限于不可抗力、甲方计算机

设备、网络设备不符合要求、服务器资源不充分、甲方承诺的资源缺乏、数据准备不充分和不正确、甲方决策的延误、操作人员不配合、甲方人员变更等。

本SOW中的日期均为预计日期，在项目实施开始及过程中，双方项目组应严格遵守双方约定的项目总体实施计划开展和推进，如因双方特殊原因导致需对项目计划进行调整，应由双方共同协商，提交项目变更流程。

定制化开发工作

1) 需求调研：甲方应积极配合乙方完成需求的调研、讨论及确认工作。如果因为甲方配合不利导致 需求调研、讨论及确认等工作拖延，甚至无法开展，则甲方应承担项目拖延、需求变更等相应的责任；

2) 定制化开发：根据定制化开发工作特点，开发人员的工作方式包括远程方式和现场方式，大部分开发工作将在金蝶封闭研发环境下进行，开发顾问会根据项目实际需要安排现场支持；

3) 运行支持：自定制化开发产品或功能在生产环境上线之日起 1 个月，为运行支持服务期，乙方向甲方提供运行支持服务，服务内容包括数据问题处理、功能问题处理、软件细节功能问题调整、版本升级维护。超过运行支持服务期，如果甲方需要乙方继续提供服务，则双方需要另行签订《交付服务合同》；

4) 版本升级：超过运行支持服务期，乙方不提供定制化开发软件产品或功能的版本升级服务。如甲方有升级服务需求，甲、乙双方可根据升级的可行性与工作量估算，并通过协商另行签订《交付服务合同》。例如，本次定制化开发基于金蝶 XXX 产品 V9.4.1 版本，甲方要求升级到 V9.4.2 或者 V10.0，则均属于版本升级。

数据准备工作

1) 甲方能够按照项目工作计划的要求，及时提供实施项目实施所要求的各种业务数据信息及其他信息并满足整个项目的进度的要求；

2) 乙方项目组顾问负责提出实施的数据迁移策略和计划，甲方负责源数据的准备、整理、转换及负责数据的准确性并符合系统导入要求的格式，甲方负责开展数据准确性的验证；

3) 由于数据准确性有误导致上线不成功的，甲方将承担再次上线造成额外工作量的费用增加；

测试工作

1) 乙方负责提供测试计划，甲方需配合乙方顾问确认需要测试的业务场景并准备测试数据。在顾问团队的协同下，甲方将审阅所有测试资料，以使测试准确进行；

2) 甲方应及时向乙方免费提供所有双方一致同意的用于软件测试所必要的技术数据、计算机设备、文档、文件、测试数据、示例输出，或其它信息和资源。甲方应对其提供的所有该类数据、材料以及信息的内容、准确性、完整性和统一性负责，并承担由此产生的问题的责任；

3) 甲方人员将在乙方的指导下准备 UAT 测试资料、执行测试、以及测试分析，并提交项目测试报告；

工作范围

1) 本项目实施将严格遵循本合同所界定的工作范围，任何增加、增强或修改将通过变更控制流程作为变更请求处理；

2) 由于项目实施中甲方组织结构、业务模式的调整，从而影响到甲方已确认的系统设计和项目实施计划，责任不由乙方承担；导致的进度延期从而造成的交付成本增加甲方需要支付实施的额外费用；

培训工作

1) 甲方须与乙方项目组一起制订培训计划和安排培训课程，派遣甲方员工进行必要的培训与乙方项目组一起工作；

2) 甲方应确保关键用户具备基本的计算机应用能力及业务理解能力；

3) 在蓝图设计阶段，甲方核心项目组成员应接受相关的金蝶产品知识的培训。

4) 金蝶采用“培训关键用户”的方式向甲方关键用户赋能，再由关键用户向其他最终用户进行赋能，故甲方需在项目启动后确认关键用户，并保证关键用户的稳定性和参与项目的时间。

未特定指派工作

本合同中未约定的，甲方未特定地指派给乙方的交付相关工作任务应由甲方负责，并由甲方监督、管理和控制。乙方可以根据其自身的知识和经验对甲方执行该任务提供相应的建议或帮助，但该建议或帮助不构成乙方在本合同项下的任何义务或承诺，甲方应根据其自身的判断进行决定并承担相应的责任。

项目语言

1) 项目参与各方交流所用的语言为中文，所有交付文档使用中文。如果需要使用其它语言，由需求提出方支付翻译费用。

6.1.2项目暂停与中止

有下列情形之一的，项目暂停或中止：

(1) 因不可抗力致使项目不能继续进行的；

(2) 甲方未按时支付合同款项的；

(3) 一方有其他合理理由需要中止或暂定的情形，但需要双方友好协商一致；

(4) 法律规定的其他情形。

项目暂停

项目暂停指令必须由项目领导小组发出，在项目领导小组发出项目暂停指令之前，项目工作还需要按原计划进行。如果项目复工时，需要保留原来的顾问团队，则保留顾问团队的成本将由甲方承担。否则，乙方将不承诺复工时的项目团队为原来的顾问团队(由于离职导致的人员调整乙方不保证原来的顾问团队)。并且，乙方有权利要求组织团队所需要的时间段。该时间段由双方进行友好协商。对于项目复工，组织团队时间最长不得超过6周。

项目终止

项目终止必须由项目领导小组决定。在项目领导小组发出项目终止指令之前，项目工作还需要按原计划正常进行。在项目终止指令发出之后，由乙方项目经理主导，甲方项目经理协助，完成项目终止协议。此终止协议内必须包括终止费用类型及金额。项目终止协议执行完毕前的所有费用，将由甲方承担。如果对于项目终止计划以及费用有任何争议，由项目领导小组商定。

6.2 项目约定

6.2.1项目工作约定

(1) 工作地点：本次项目实施采取“远程+集中办公”模式；集中办公地址：广州市南沙经济技术开发区塘坑工业村。如项目需要，在其他地点工作的甲方员工，需根据项目要求到上述项目实施地点配合项目实施工作；

(2) 工作时间：本项目的正常工作时间为周一至周五的上午9:00-下午18:00，法定节假日正常休息；

(3) 甲方承诺提供项目组织中所需的各项资源，为乙方项目组提供一个适应的工作环境；

(4) 在项目实施之前，甲方应该建立项目组织，并明确每个成员的角色和职责；

(5) 当业务目标、需求和限制被明确后，关键用户能够对问题及时响应，并在五个工作日内做出最终决定；

(6) 实施过程中，项目领导小组将按照项目计划在项目的每个阶段结束时召开会议，该会议由甲方项目经理组织召开；

6.2.2计划管理约定

项目启动阶段，双方项目经理确认并签署最终版的《项目总体计划》，所有的项目实施工作必须在总体计划控制下进行。

双方在前期共同确定《项目周计划》发布时间，项目过程中按时发布；针对问题日志记录，乙方项目经理将提前一天发出会议通知及相应的解决方案文档。

如果问题日志记录中的专题存在意见分歧，由乙方顾问提供参考性的解决方案，项目组根据风险级别评估，提交相应的风险报告，并报双方项目领导小组进行最终决策，以确保项目的进度。

计划包括总体计划、周计划；其中总体计划要根据项目的进度安排进行更新，周计划由乙方项目经理根据项目总体计划进行安排。

计划种类	管理方法	制作人
项目总体计划	项目准备初期制定，若过程中当发生重大变更等情况，根据需求变更审批表调整总体计划	乙方项目经理
项目周计划	按双方约定的时间发布周计划，建议提前一天总结计划完成情况	乙方项目经理

6.2.3沟通约定

在项目实施过程中，项目沟通主要以业务调研&访谈、专题会议、周例会、阶段工作汇报或验收、月度汇报会、邮件、电话、关键用户与顾问一起办公的方式进行，具体的工作展开，根据双方制定的项目管理周计划为依据。针对业务调研&访谈、专题会议、周例会、月度汇报会要有相应的会议纪要。

乙方将以项目小组会议的方式，组织双方成员进行讨论，达成项目实施过程的项目沟通交流的目的；沟通会议类型如下：

类型	参加人员	频率	主导者	方式
日例会	项目组成员	每日	项目经理	非正式交流
周例会	项目总监，项目组成员	每周	项目经理	会议
月例会	项目总监，项目组成员，执行组长	每月	项目经理	会议
阶段总结会议	项目领导小组，项目总监，项目组成员，执行组长	阶段结束	项目经理	会议
项目重要任务确认（流程方案、上线方案）	项目领导小组，项目总监，项目组成员，执行组长	专题讨论会	项目经理	会议
项目范围变更会议	项目领导小组、项目组核心成员	按需召开	项目经理	会议

所有沟通所涉及修订的交付物或者会议纪要由项目组以正式邮件或者书面发给相关干系人，如果相关干系人在五个工作日内未回复意见，则视为接受。

6.2.4文档管理约定

在项目实施过程中，由于项目实施的复杂性，多部门人员参加以及时间跨度长等因素，所以任何需求、建议、解决方案和结论都必须文档化、标准化，以便查阅和引用。项目的文档是项目

工作过程及结果的反映，是项目控制的依据，同时也是“知识转移”的关键载体，因此必须对项目整个过程都要充分文档资料化。

6.2.5知识转移约定

乙方顾问通过组织培训或现场指导，使关键用户都必须能够熟练地进行系统操作；关键用户负责对最终用户的培训。对于交付过程中发生的维护记录，乙方顾问或维护人员必须明确承诺将问题处理过程形成规范的维护记录，并定期提交给甲方项目经理。

6.2.6风险管理约定

此部分主要明确项目组可能在实施过程中遇到的风险。

1.显著改变项目的实施范围

➢风险程度：高；

➢后果：由于需要额外的时间来研究范围变更的后果，因而可能使项目延期；

➢风险防范：

(1) 分阶段进行项目的实施。每一阶段都制定切实可行的目标和时间要求；

(2) 项目开始前双方同意有关范围目标和实施方法的一般原则；

(3) 正式提交变更请求前认真考虑时间，成本和产出的三角制约关系；

(4) 按照范围变更的优先级别作不同的处理。

➢早期预防措施：在项目开始前仔细研究项目的范围和目标；

2.不能及时地审阅和签署顾问方提交的文档

➢风险程度：高；

➢后果：影响后续任务的开展。可能使项目延期；

➢风险防范：

(1) 在甲方项目经理不能履行职责时，应授权并任命新的项目经理；

(2) 事先制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表；

(3) 将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档分别签字。

➢早期预防措施：尽早召开高层经理会议，制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表；

3.系统实施引起的业务流程改变和部门岗位变化不能推行

➢风险程度：高；

➢后果：最终用户不能积极配合项目实施；使系统迟迟不能正式启用，因而可能使项目延期甚至失败；

➢风险防范：

(1) 调整实施目标使之更符合企业的现实；

(2) 争取企业领导层的全力支持；

(3) 制定项目工作计划时留有余地；

(4) 积极宣传和引导这些改变给企业带来的好处。

➢早期预防措施：在方案设计时进行可行性分析，争取企业领导层的全力支持；

4.项目组关键用户不足或频繁更换

➢风险程度：高；

➢后果：不能完成项目工作计划所赋予的任务，接替者需要额外的时间来熟悉项目和赋予他的工作；从而影响项目的进程和成本；

➢风险防范：

(1) 尽早寻找合适的关键用户进入项目小组；

(2) 将工作任务分解到足够小，使有关人员可以在完成任务后离开项目小组；

(3) 根据项目工作计划，严格控制项目关键用户的变动。如有变动事先应得到对方的认可。

➢早期预防措施：选配和固定合格的项目关键用户；

7 项目验收

7.1 项目实施完成确认

达到如下特征，即可认为项目交付完成，可以进行项目验收。

序号	特征
1	上线支持完成
2	本SOW交付物清单章节约定交付物完成

7.2 验收标准

本项目采用分阶段提交成果和验收的方法，各项目阶段工作完成后，乙方项目团队会向甲方提交阶段交付成果物作为阶段验收内容，甲方负责对验收内容进行审核确认和签字，阶段验收内容通过确认和签字即代表阶段验收完成，项目验收报告（包括《实施完成确认单》）签字确认代表项目整体通过验收。

在得到当前阶段成果的确认后，再开始下一阶段的实施工作，以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。在整个项目实施期间，可建立多个阶段成果的验收点。

任何在验收阶段发现的问题将归类为以下四类之一：

问题级别	问题级别定义
1级	对业务有至关重要的影响，系统完全丧失了服务功能或丢失了所有的资源，工作无法再继续进行。系统完全不可用。
2级	对业务有严重的影响；系统丧失重要的服务功能，已丢失失重要的资源
3级	错误及bug，影响到系统的个别功能，但不影响系统正常操作流程的执行
4级	对业务没有影响，用户工作正常，没有因为该事件的存在而妨碍其工作，可正常查询和报告信息。

只有1级、2级问题可以被认为是系统不被验收通过的依据，其它不影响项目交付成果使用遗留的3~4级问题，乙方提交可行的解决计划在运维期间解决，不影响项目验收。

7.3 验收方法

经乙方上线自检后符合验收条件的，由乙方提出书面验收申请，甲方应在乙方提出申请后的5个工作日内回复乙方。若甲方未能在乙方提交项目验收报告后5个工作日内签署或提出书面修改意见，则可视为甲方同意验收。如同意验收，乙方应及时准备资料并会同甲方组织验收工作，经验收达到合同约定的验收标准的，甲乙双方共同签署最终的项目验收报告，通过验收之日即为项目实施完毕之日。

7.4 验收内容

7.4.1验收内容

甲乙双方项目经理代表负责系统实施、测试和验收的各项工作，双方之间的任何争议应由双方代表友好协商解决。如果存在任何问题和争议，双方应共同分析原因、澄清责任、解决问题，并记录解决过程。

验收阶段的1级、2级问题需要在项目验收前解决，其他不影响项目交付成果使用遗留的3~4级问题，如需在验收后的系统质保期解决，双方应对这些问题以及处理计划进行详细书面记录，由双方代表签字，各持一份。

在满足上述验收标准时，按以下程序进行：

1.乙方准备验收资料；

2. 甲方项目组检查验收资料并确认；

3. 双方组织项目验收会议；

4. 完成项目交付物的评审与交接；

5. 双方签署项目验收报告。

7.4.2交付物清单

实施阶段	交付成果	甲方签章
启动	《总体计划》	√
需求	《调研纪要》	
方案	《业务蓝图》	
	《物料编码规范文档》	
	《物料清单（BOM）设计规范文档》	
	《业务蓝图确认单》	√
构建	《系统开通函件（公有云）》	
测试	《用户操作手册》	
	《UAT测试确认单》	√
上线	《系统上线完成确认单》	√
验收	《实施完成确认单》	√
项目管理	《服务明细单》	√

8 项目控制程序

8.1 项目变更控制程序

如果需要更改本工作说明书中涉及的内容，应遵循以下程序。

需求变更申请单（PCR）是协商变更的工具。PCR 必须描述变更、变更的根本原因和变更对项目的影响。

双方项目经理应复核建议的变更并提议进一步研究或予以拒绝。 PCR 必须由双方授权代表签署以授权研究所建议的变更。该研究将确定该 PCR 的实施对项目成本、项目进度以及协议其它条款和条件的影响。由双方商务确认计价方式与金额，签订补充合同后才执行变更的工作内容。

在建议的变更未被书面确认前，双方仍继续按最后同意的工作说明书的版本执行有关项目的工作。

项目变更具体执行方式如下：

在项目的实施过程中，任何一方要想更改由双方事先确认并计划好的服务内容，可以向对方提交一份“需求变更申请单”（PROJECT CHANGE REQUEST，以下简称PCR）。详细说明想要做出的更改。可能的变更包括实施范围的更改、实施周期的更改、实施方案的更改等。双方将对所需的更改服务提供附加收费估算及项目进度、交付成果的调整建议；所有的变更请求均应报双方项目领导小组审批，仅当与之相关的所有技术及商务事宜同时得到双方项目领导小组的批准后，有关的项目变更才可执行。

- 甲方、乙方任何一方都有权利提出 PCR。
- 请求方的项目经理应复核建议的变更，并确定是否将该请求提交给对方。

提出变更

提出变更需首先填写PCR。PCR需由申请方项目经理交给对方项目经理。接收方项目经理将就PCR的技术可行性以及对整个项目的影响做出评估。经接收方项目经理同意的PCR将提交项目领导小组批准备案，未被批准的PCR将退还给申请方项目经理。任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。

接收方的响应

接收方项目经理将在接到PCR的三个工作日内确认收讫。如果乙方是接收方，乙方可对PCR内容以书面形式告知甲方收费标准，乙方将于甲方同意收费标准后三十天或双方协定的时间内，对PCR进行分析研究并提出实施建议。

PCR 主要内容包括以下方面：

- 基本变更 – 文件的增改和删除；
- 项目目标；
- 产品名称、版本、模块；
- 实施/开发主体和部门；
- 业务范围；
- 实施/开发服务范围；
- 客户化开发范围；
- 方案变更；
- 进度计划；
- 项目资源；
- 里程碑与交付物；
- 其他

PCR的批准

- 双方项目经理需对 PCR 进行书面确认。任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。
- 在双方项目经理确认后，还需由项目领导小组批准。
- 批准后的 PCR 将以“项目变更协议”的形式成为本交付合同的附件，同时取代前期的任何相冲突的附件。

变更实施

- 双方将根据经确认批准的 PCR 重新调整项目计划，并进行任务分配。
- 双方将根据新的项目计划履行各自的责任。

变更程序流程

- 申请方以书面形式提出 PCR。
- 将 PCR 提交对方(或项目领导小组)作技术可行性评定与变更评估。

- 乙方以书面形式给出 PCR 的实施时间和所需费用。
- 甲方项目经理组织讨论乙方提出的时间和费用。
- 乙方确认变更所需费用和进度。
- 双方项目经理(或项目领导小组)讨论 PCR 并提出实施建议。
- 项目领导小组批准 PCR。
- 如果双方均同意 PCR,那么双方需在 PCR 上签字。当累计变更金额不超过本合同金额的 10%时，由双方项目经理及项目领导小组签字。当累计变更金额超过本合同金额的 10%时，双方需要加盖公章。
- 甲乙双方拟定变更合同及变更 SOW。
- 实施变更任务。

PCR模板见附件二《需求变更申请单》

8.2 交付物接受程序

项目交付物将按照以下程序复核并接受。

交付物的一份电子/打印稿应提交给甲方项目经理。甲方项目经理负责制作额外的副本并分发给任何其他复核人员。

在收到交付物5个工作日内，甲方项目经理应接受交付物或向金蝶项目经理提供一份要求修改的书面或邮件要求。如果在5个工作日内，未从甲方项目经理收到任何回应，则该交付物视为被接受。

金蝶项目经理将基于金蝶的义务考虑甲方的修改要求。金蝶同意的甲方的修改将被更新，并将更新最后版本重提交至甲方项目经理，届时，该交付物将视为被接受。

金蝶不同意的甲方的修改将按照『项目变更控制程序』处理。本交付物接受程序所产生的争议将按照『争议解决程序』来解决。

8.3 争议解决程序

如果需要解决本工作说明书期间所产生的争议，应遵循以下处理程序。

当在甲方和金蝶之间产生争议时，项目团队成员应首先努力内部解决该问题。

低级：如果项目团队无法在两个工作日内解决争议时，双方项目经理共同解决该问题。

中级：如果双方项目经理介入后两个工作日内争议仍未解决，双方项目总监共同解决该问题。

高级：如果双方项目总监介入后该争议仍未解决，按照合同约定原则执行或者寻求法律仲裁。

在任何争议解决期间，金蝶同意继续提供不在争议项目范围内、并完全不受争议所影响的服务。甲方亦同意按照协议继续支付相应的费用。

甲方：（章）

甲方签名：

签订日期：

乙方：（章）

乙方签名：

签订日期：

9 附件一：《利民集团ERP项目WBS》

序号	任务名称	开始日期	结束日期
1	启动	2026/3/9	2026/3/11
1.1	项目启动	2026/3/9	2026/3/9
1.1.1	组建项目团队	2026/3/9	2026/3/9
1.1.2	项目启动	2026/3/9	2026/3/9
1.2	售前交接	2026/3/9	2026/3/9
1.2.1	售前交接会	2026/3/9	2026/3/9
1.2.2	售前文档交接	2026/3/9	2026/3/9
1.3	实施准备	2026/3/9	2026/3/9
1.3.1	实施筹备	2026/3/9	2026/3/9
1.3.2	协助客户成立项目组	2026/3/10	2026/3/10
1.3.3	编制项目章程（项目公约）	2026/3/10	2026/3/10
1.3.4	关键用户动员会	2026/3/10	2026/3/10
1.4	制定计划	2026/3/10	2026/3/10
1.4.1	编制总体计划	2026/3/10	2026/3/10
1.4.2	编制资源投入计划	2026/3/10	2026/3/10
1.5	启动会	2026/3/11	2026/3/11
1.5.1	启动会准备	2026/3/11	2026/3/11
1.5.2	召开启动会	2026/3/11	2026/3/11
2	需求	2026/3/12	2026/4/2
2.1	调研准备	2026/3/12	2026/3/12
2.1.1	编制调研计划	2026/3/12	2026/3/12
2.1.2	准备调研模板	2026/3/12	2026/3/12
2.2	现状调研	2026/3/13	2026/3/27
2.2.1	高层访谈	2026/3/13	2026/3/27
2.2.2	销售流程调研	2026/3/13	2026/3/27
2.2.3	采购流程调研	2026/3/13	2026/3/27
2.2.4	生产流程调研	2026/3/13	2026/3/27
2.2.5	委外流程调研	2026/3/13	2026/3/27
2.2.6	跨组织流程调研	2026/3/13	2026/3/27
2.2.7	财务管理调研	2026/3/13	2026/3/27
2.2.8	成本核算调研	2026/3/13	2026/3/27
2.2.9	调研总结汇报	2026/3/30	2026/3/30

2.3	**系统演示**	2026/3/31	2026/3/31
2.3.1	系统演示	2026/3/31	2026/3/31
2.4	**分析培训**	2026/4/1	2026/4/2
2.4.1	分析培训	2026/4/1	2026/4/2
3	**方案**	2026/4/3	2026/5/7
3.1	**标准功能培训**	2026/4/3	2026/4/8
3.1.1	培训方案设计	2026/4/3	2026/4/8
3.1.2	标准功能培训	2026/4/3	2026/4/8
3.1.3	专项技能培训	2026/4/3	2026/4/8
3.2	**核心流程及功能分析与模拟**	2026/4/9	2026/4/30
3.2.1	核心流程及功能分析	2026/4/9	2026/4/30
3.2.2	核心流程及功能模拟	2026/4/9	2026/4/30
3.2.3	组织专题讨论	2026/4/9	2026/4/30
3.3	**编写业务蓝图**	2026/4/9	2026/4/30
3.3.1	销售流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.2	采购流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.3	生产流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.4	跨组织流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.5	委外流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.6	应收流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.7	应付流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.8	成本流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.9	出纳流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.3.10	总账流程蓝图	2026/4/9	2026/4/30
3.4	**方案汇报**	2026/5/6	2026/4/30
3.4.1	业务蓝图汇报会	2026/5/6	2026/5/6
3.4.2	业务蓝图确认	2026/5/7	2026/5/7
4	**构建**	2026/5/8	2026/6/3
4.1	**系统配置**	2026/5/8	2026/5/29
4.1.1	系统配置	2026/5/8	2026/5/29
4.1.2	套打模版设计	2026/5/8	2026/5/29
4.1.3	表单设计	2026/5/8	2026/5/29
4.2	**基础数据收集**	2026/5/8	2026/5/29
4.2.1	基础数据收集计划	2026/5/8	2026/5/29
4.2.2	基础数据收集模板	2026/5/8	2026/5/29
4.2.3	销售期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29

4.2.4	采购期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29
4.2.5	生产期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29
4.2.6	委外期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29
4.2.7	应收期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29
4.2.8	应付期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29
4.2.9	成本期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29
4.2.10	出纳期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29
4.2.11	总账期初数据收集	2026/5/8	2026/5/29
4.2.12	基础资料收集	2026/5/8	2026/5/29
4.3	**UAT培训**	2026/6/1	2026/6/3
4.3.1	UAT测试培训准备	2026/6/1	2026/6/1
4.3.2	UAT测试培训	2026/6/2	2026/6/3
5	**测试**	2026/6/4	2026/7/25
5.1	**整体测试计划**	2026/6/4	2026/6/4
5.1.1	整体测试计划	2026/6/4	2026/6/4
5.2	**编写测试用例**	2026/6/5	2026/6/8
5.2.1	测试用例编写	2026/6/5	2026/6/8
5.2.2	测试用例评审	2026/6/9	2026/6/9
5.3	**集成测试**	2026/5/28	2026/6/25
5.3.1	模块测试	2026/6/10	2026/6/25
5.3.2	集成测试	2026/6/10	2026/6/25
5.4	**编写用户操作手册**	2026/6/10	2026/6/25
5.4.1	编写用户操作手册	2026/6/10	2026/6/25
5.5	**最终用户培训**	2026/6/10	2026/6/25
5.5.1	最终用户培训准备	2026/6/10	2026/6/25
5.5.2	最终用户培训	2026/6/10	2026/6/25
5.5.3	培训考核	2026/6/10	2026/6/25
5.6	**UAT测试**	2026/6/26	2026/7/25
5.6.1	UAT测试方案	2026/6/26	2026/7/25
5.6.2	UAT环境准备	2026/6/26	2026/7/25
5.6.3	UAT测试	2026/6/26	2026/7/25
5.6.4	UAT测试签字确认	2026/6/26	2026/7/25
6	上线	2026/7/27	2026/10/23
6.1	**上线准备**	2026/7/27	2026/7/28
6.1.1	上线切换策略	2026/7/27	2026/7/28
6.1.2	生产环境准备	2026/7/27	2026/7/28

6.1.3	上线数据准备	2026/7/27	2026/7/28
6.1.4	上线事项检查	2026/7/27	2026/7/28
6.1.5	上线动员会材料准备	2026/7/27	2026/7/28
6.2	系统初始化（REC、RILHK、RILNS）	2026/7/29	2026/7/29
6.2.1	制定初始化指导手册	2026/7/29	2026/7/29
6.2.2	系统初始化及数据补录	2026/7/30	2026/7/30
6.3	**系统上线**	2026/7/31	2026/7/31
6.3.1	上线动员会召开	2026/7/31	2026/7/31
6.3.2	系统上线切换	2026/7/31	2026/7/31
6.3.3	上线问题管理	2026/7/31	2026/7/31
6.3.4	上线运行	2026/7/31	2026/7/31
6.4	**上线辅导**	2026/7/31	2026/10/23
6.4.1	上线支持计划	2026/7/31	2026/10/23
6.4.2	常见问题集	2026/7/31	2026/10/23
7	**验收**	2026/10/24	2026/10/30
7.1	**项目总结**	2026/10/24	2026/10/30
7.1.1	整理项目文档	2026/10/24	2026/10/30
7.1.2	编制项目案例	2026/10/24	2026/10/30
7.1.3	项目总结	2026/10/24	2026/10/30
7.2	**项目验收**	2026/10/24	2026/10/30
7.2.1	准备验收会议	2026/10/24	2026/10/30
7.2.2	召开验收会议	2026/10/24	2026/10/30
7.2.3	签署验收单	2026/10/24	2026/10/30
7.3	**项目交接**	2026/10/24	2026/10/30
7.3.1	客户运维交接	2026/10/24	2026/10/30
7.3.2	金蝶运维交接	2026/10/24	2026/10/30
7.3.3	文档归档	2026/10/24	2026/10/30
7.4	**项目关闭**	2026/10/24	2026/10/30

10 附件二：《需求变更申请单》

需求变更申请单(PCR)

项目名称：

合同名称：

合同编号：

签约时间：

申请人：

部门（公司）： **联系电话：**

申请日期(年/月/日)： 20XX/XX/XX

申请变更内容：

申请人签名： 日 期：

申请变更原因：

申请人签名： 日 期：

申请部门领导意见：

签名： 日 期：

变更对本项目的影响评估：（描述对项目在实施范围、进度、人力资源、交付件等方面的影响，并提出具体工作量、成本新增估算。）

变更类别：

新业务需求	方案变更	人员变更	接口	报表和表单	计划调整	其它

变更内容详细描述及对相关部门和业务的影响：

新增工作量及成本评估

序号	变更内容	新增工作量	新增成本	备注
1				
2				
3				
合计:				

新增工作量对项目交付周期的影响:

乙方顾问签名:　　日 期:

变更审批意见

A) 甲方项目经理的意见

批准	拒绝	待议	理由说明	签名（盖章)	时间

B) 乙方项目经理的意见

批准	拒绝	待议	理由说明	签名（盖章)	时间

11 附件三：《项目经理任命书》

项目经理任命书

单位名称:_____ 合同名称：_____

合同编号:_____ 签约时间：_____

项目名称:_____

☐1、任命我单位____（姓名），手机号_____，电子邮件_____自任命之日起担任项目经理（岗位），代表我单位在项目执行过程中产生的相关文档上签字。签字方式包括电子签字与线下签名。签字文档包括但不仅限于以下文件，具体以双方项目组约定为准：*金蝶中国服务明细确认单、业务蓝图确认单、UAT测试确认单、系统上线完成确认单、实施完成确认单/开发完成确认单*

☐2、原项目经理（岗位）_____（姓名），手机号_____，电子邮件_____自任命之日起变更为_____（姓名），手机号_____，电子邮件_____，代表我单位在项目执行过程中产生的相关工作文档及成果文档上签字，双方已进行了交接。签字方式包括电子签字与线下签名。签字文档包括但不仅限于以下文件，具体以双方项目组约定为准：*金蝶中国服务明细确认单、业务蓝图确认单、UAT测试确认单、系统上线完成确认单、实施完成确认单/开发完成确认单*

特此通知!

授权单位盖章（单位公章或合同章）

项目经理（被授权人）：

任命日期：____年___月___日

注：1、人员任命选择序号1，人员变更选择序号2。人员任命或变更时，选择对应序号内容填写后请删除其他序号内容。

2、被授权人必须签字，请保持字迹清晰工整，以便和项目相关文档笔迹一致。有此授权书，项目相关文档有被授权人签字即有效。

3、被授权人对后续交付过程文档签字，电子签章与电子签名方式，与线下签字盖章的纸质文件具备同等的法律效力。
